廿日市市
橋梁長寿命化修繕計画

令和５年９月改定

廿　日　市　市

目　　次

1. 老朽化対策における基本方針 1
1.1　背景 1
1.2　目的（目標） 2
1.3　基本方針 2
1.4　計画の期間 2
1.5　管内の橋梁箇所数 3
1.6　管理する主な橋梁 4
1.7　点検と診断 5
1.7.1　定期点検 5
1.7.2　健全性の診断 6
1.8　老朽化の状況 7
1.8.1　管理橋梁 7
1.8.2　主な損傷事例 8
1.9　修繕等措置の着手状況 9
1.10　対策の優先順位 10
1.10.1　優先順位 10
1.10.2　橋梁の分類(グループ分け) 11
1.10.3　管理水準 12
2. 新技術等の活用方針 13
2.1　方針 13
2.2　目標 13
3. 費用の縮減に関する具体的な方針 13
3.1　方針 14
3.1.1　予防保全型の維持管理への移行 14
3.1.2　集約化・撤去，機能縮小 14
3.2　目標 14
3.2.1　予防保全型の維持管理への移行 14
4. フォローアップ 15
5. 個別の構造物ごとの事項 15

1. 老朽化対策における基本方針

1.1　背景

廿日市市が管理する道路橋は，高度経済成長期からバブル期にかけて多くの橋梁が建設されています。今後，これらの橋梁が建設後50年を経過し，急速に高齢化が進行する見込みです。今から適時適切な維持補修を実施しなければ集中的に大規模な補修や架替が必要となり，今後大きな財政負担が必要になると予想されます。

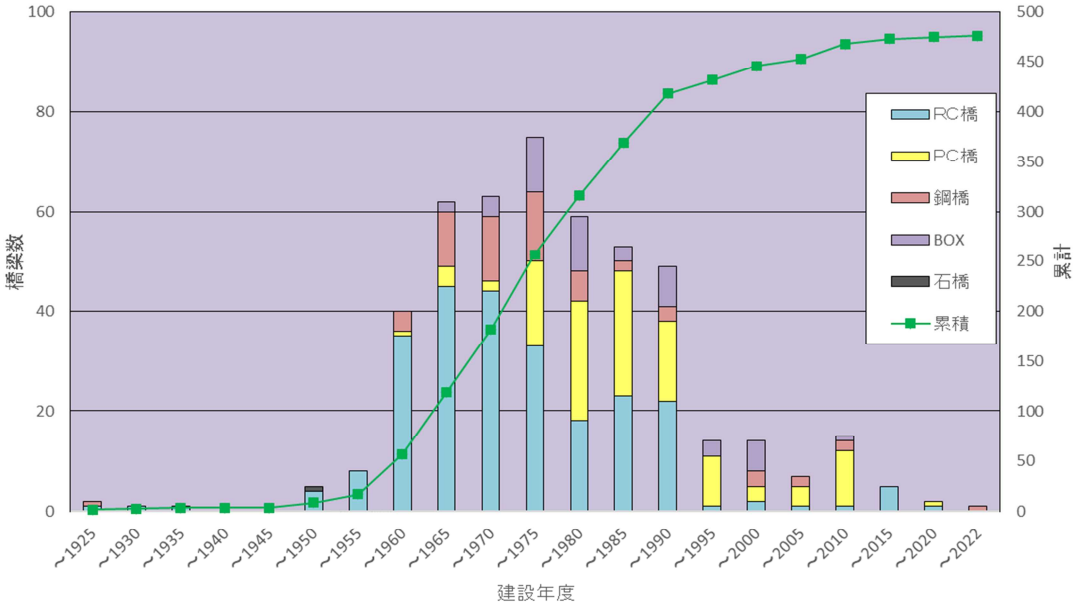

図 1-1　建設年度の分布

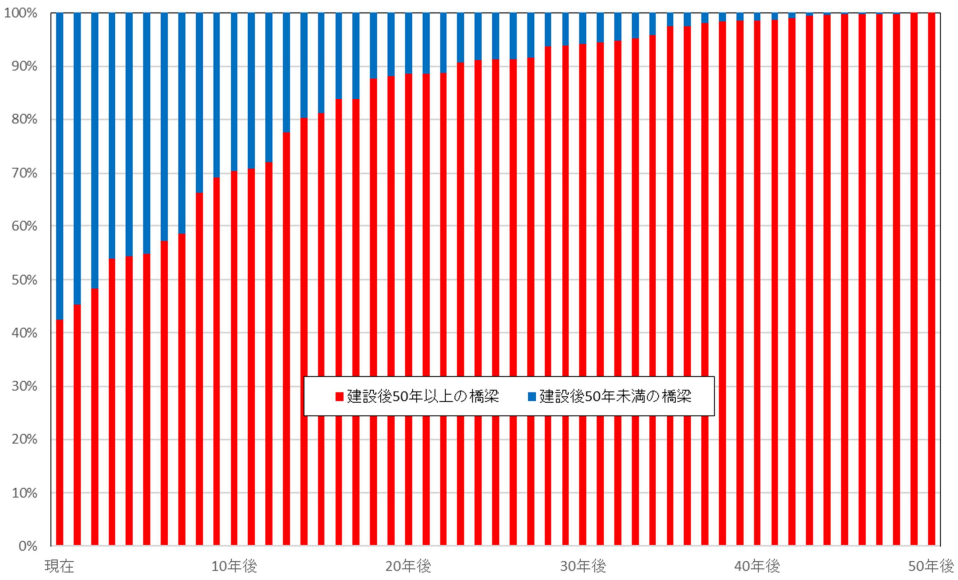

図 1-2　建設後 50 年以上の橋梁数

1.2　目的（目標）

アセットマネジメントの考え方を導入し，従来の「事後保全型の維持管理」から，定期点検により橋梁の状態を把握し，点検結果に基づく補修を計画的に行う「予防保全型の維持管理」を実施することで，橋梁の長寿命化を図り，維持管理及び更新費用等のライフサイクルコストの縮減を目指すとともに，道路ネットワークの安全性・信頼性の確保を図ります。

1.3　基本方針

定期点検の点検結果により評価された健全度から修繕が必要な橋梁を優先順位に基づき選定したのち，新技術を活用する等，LCC を含めた費用比較により適切な修繕方法または更新を決定し，修繕等を実施します。

なお，定期点検の結果から，健全度Ⅳと判定された橋梁は，早期に対策が必要なため，速やかに修繕等を実施します。

また，道路利用者および第三者への被害が懸念される損傷が発見された場合には，健全度にかかわらず，速やかに修繕等を実施します。

1.4　計画の期間

橋梁長寿命化修繕計画の計画期間は 5 年(令和 5 年度～令和 9 年度)とします。

1.5　管内の橋梁箇所数

廿日市市では 476 橋（橋長 2m以上）を管理しています。

上部工の使用材料別にみると，コンクリート橋(PC 橋，RC 橋)が約 77%，鋼橋が約 13%，BOX（溝橋）が約 10%を占めています。(図 1-3)

表 1-1　廿日市市が管理する橋梁の一覧表

橋　　長	現　況(令和 4 年 3 月末現在)
15m以上	橋 梁 数　　369 橋
15m未満	橋 梁 数　　107 橋

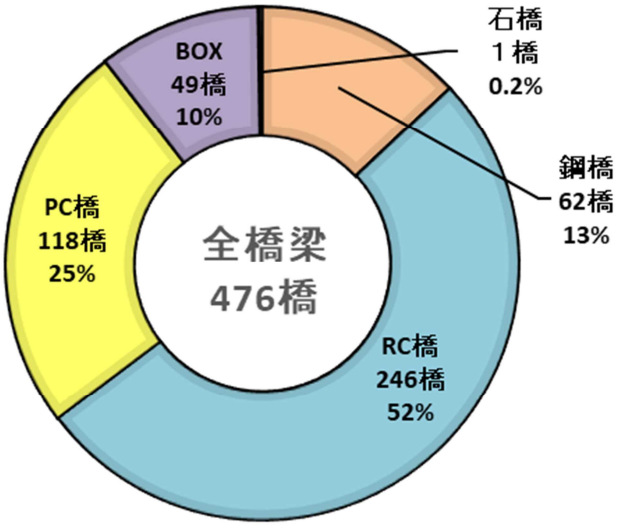

図 1-3　橋種別橋梁数

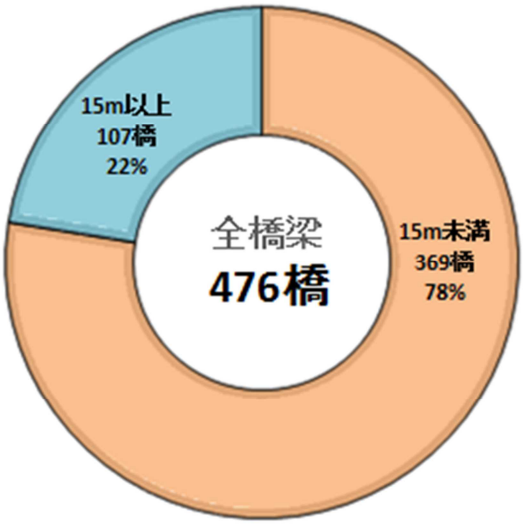

図 1-4　橋長別橋梁数

1.6　管理する主な橋梁

・猿候橋 L=53.7m（RC 橋）

・七尾陸橋 L=83m（RC 橋）

・新佐方大橋 L=68m（RC 橋）

・河津原橋 L=19.5m（RC 橋）

・縄田橋 L=41.6m（RC 橋）

・滝橋 L=10.9m（RC 橋）

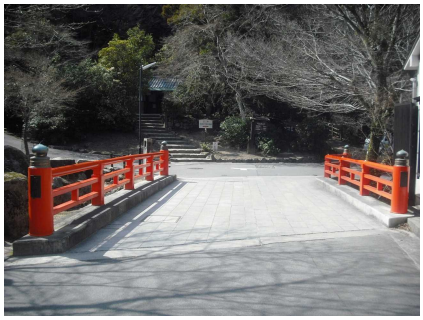

1.7　点検と診断

橋梁点検は，日常点検，定期点検，異常時点検，追跡調査，詳細調査に分類しています(表1-2)。定期点検(5年に1回の実施を基本)により，橋梁の健全度を確認します。

表 1-2　橋梁点検の種類

点　　検	内　　容
日常点検	日常パトロールによる簡易点検。軽微な損傷を把握する。
定期点検	橋梁の各部材について点検を行い，橋梁部材の損傷状況を把握し今後の対策を決定するために行われる。5 年に 1 回を基本とする。
異常時点検 (臨時，緊急)	地震時や異常気象等によって橋梁が予期せぬ状況にさらされた場合に実施する。
追跡調査	橋梁にひびわれや塗装等の進行性のある損傷や，橋梁について経時的な変化を確認したい場合に実施する。
詳細調査	定期点検等で異常が見つかった橋梁について，各種試験等を実施して損傷の状態をより精度良く把握するために行われる。損傷の原因を追求して補修・補強工法を検討するために実施する。

1.7.1　定期点検

定期点検は，広島県橋梁定期点検要領に基づいて実施を行います。定期的に実施する点検を通じて橋梁の変状や劣化の兆候を把握することを目的とします。定期点検で実施する点検項目は，橋梁の損傷度を定量的に評価できるものとし，原則として近接目視で確認できるものとします。

定期点検では損傷状況を定期点検調書に記録し，点検結果に基づいて損傷区分の判定を行います。この損傷区分により維持管理の対策区分を判定し，詳細調査または補修等の判断を行います。

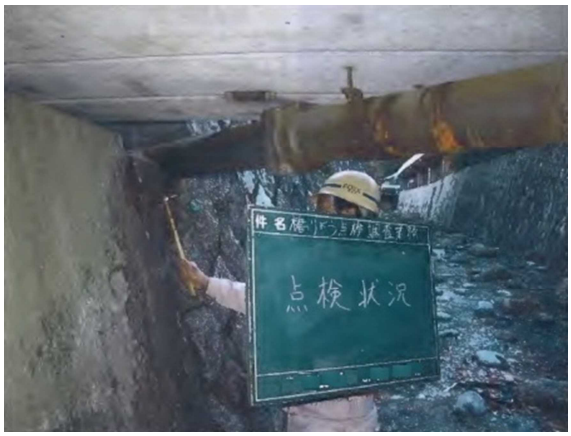

橋梁定期点検状況

1.7.2　健全性の診断

定期点検では，部材単位での健全性の診断を行います。構造上の部材等の健全性の診断は，表 1-3 の判定区分により行うことを基本とします。なお，部材単位の診断は，構造上の部材区分あるいは部位ごと，損傷種類ごとに行います。

道路橋ごとの健全性の診断は，道路橋単位で総合的な評価を行います。部材単位の健全度が道路橋全体の健全度に及ぼす影響は，構造特性や架橋環境条件，当該道路橋の重要度等によっても異なるため，総合的に判断する必要があります。一般には，構造物の性能に影響を及ぼす主要な部材に着目して，最も厳しい評価を道路橋単位での評価としています。

表 1-3　部材の健全性の診断

区分		定義
Ⅰ	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著しく高く，緊急に措置を講ずべき状態。

1.8　老朽化の状況

1.8.1　管理橋梁

定期点検を実施した橋梁のうち，補修を行う必要ない「Ⅰ判定」が 40%と占めている一方，予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である「Ⅱ判定」が 50%，早期に措置を講ずべき状態である「Ⅲ判定」が 10%を占めています。なお，緊急措置を行わなければならない「Ⅳ判定」は 0 橋でした。（令和 4 年 3 月末現在）

また，建設経過年数別にみると，建設年次が長くなると早期に修繕などその措置が必要な橋梁の割合が多くなっていく傾向にあります。（図 1-6）

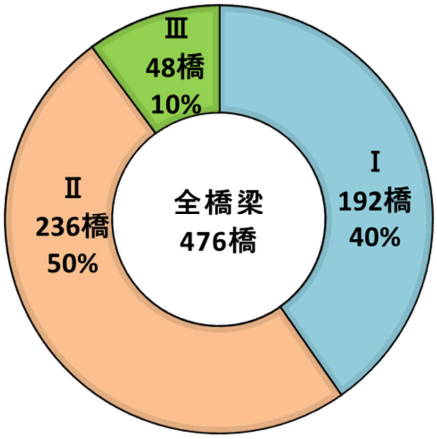

図 1-5　定期点検結果に基づく健全性

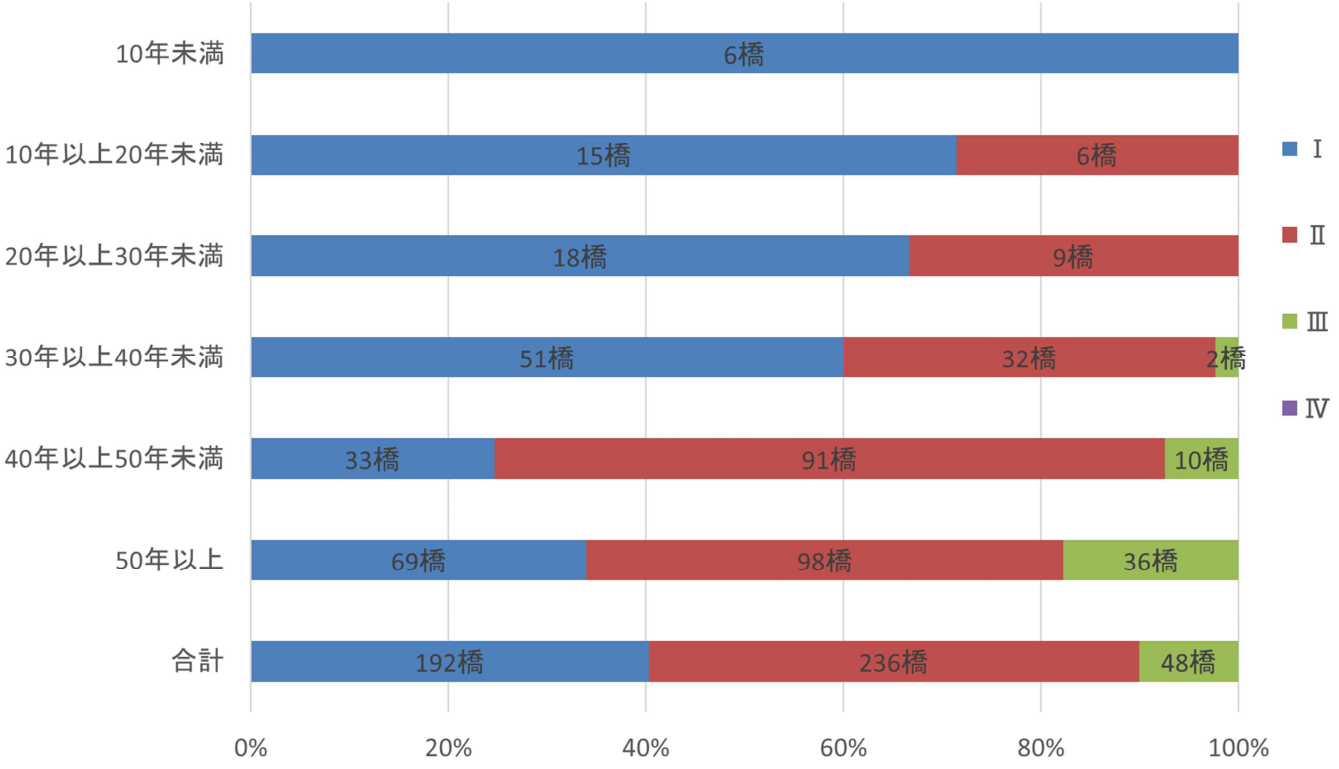

図 1-6　判定区分と建設経過年度

1.8.2　主な損傷事例

廿日市市で確認された主な損傷事例は次のとおりです。

主な損傷事例

<table>
<tr><td>
主桁の腐食(コンクリート桁)</td><td>
主桁の腐食（鋼桁）</td></tr>
<tr><td>
床版の腐食（コンクリート床版）</td><td>
床版の腐食（鋼床版）</td></tr>
<tr><td>
橋台の損傷</td><td>
支承の腐食</td></tr>
</table>

1.9　修繕等措置の着手状況

廿日市市で行った主な対策内容は次のとおりです。

【コンクリート橋：断面修復】

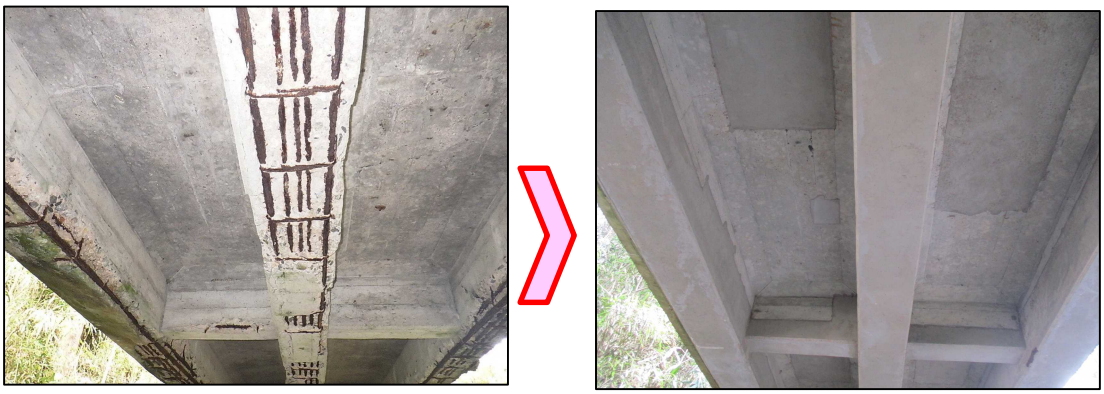

【コンクリート橋：断面修復】

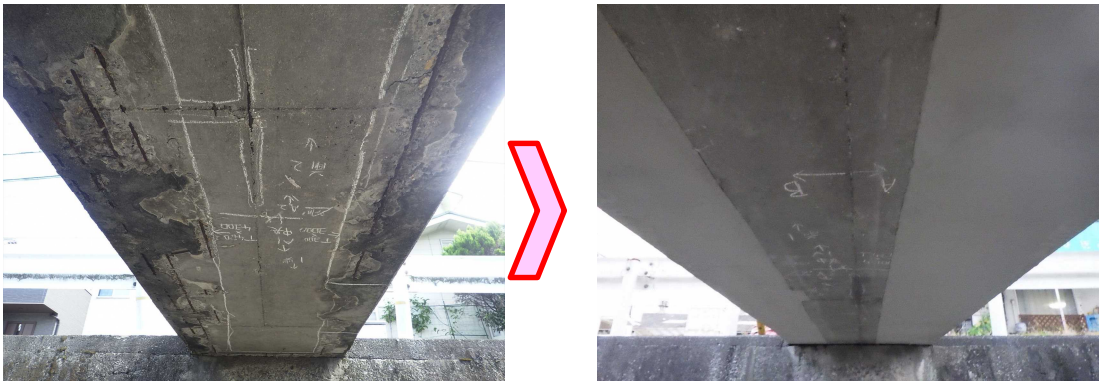

1.10　対策の優先順位

1.10.1　優先順位

対策優先順位は，以下のルールにより設定します。

①管理水準で設定した健全度を下回る橋梁

②健全度が同じ場合は，以下に示す管理区分の順

管理区分　グループ 1→グループ 2→グループ 3→グループ 4→グループ 5 の順

③管理区分が同じ場合は，以下に示す道路種別の順

道路種別　1 級市道→2 級市道→その他市道

④すべて同じ場合，表 1-4 の項目に該当する橋梁

表 1-4　橋梁優先度

項　　目	ポイントの考え方
バス路線	該　当：25 ポイント 非該当：ポイントなし
迂回路	有　：ポイントなし 無　：25 ポイント
緊急避難路線	該　当：25 ポイント 非該当：ポイントなし

1.10.2　橋梁の分類（グループ分け）

廿日市市は，小規模な橋梁から大規模な橋梁，跨道橋，跨線橋など，多様な橋を管理しています。限られた予算でこれらを一括して管理することは効果的でないため，利用者及び第三者に与える社会的影響が大きい橋梁，災害時の安全な通行を確保すべき橋梁，補修工事が大規模・高額な橋梁の場合等，橋梁の重要度や復旧の容易さ等の特性により表 1-5 のように管理区分のグルーピングを行い，グループごとに管理水準を設定しています。

表 1-5　橋梁の管理区分（グルーピング）（全橋梁 476 橋）

		重　要　度		
		跨線・跨道橋 ・渡海橋	１・２級市道	その他道路
復旧の容易さ	吊り橋や斜張橋等の特殊橋梁・長大橋	グループ 1 2 橋	グループ 2 0 橋	グループ 3 0 橋
	橋長が 15m 以上の橋梁	グループ 2 19 橋	グループ 3 35 橋	グループ 4 51 橋
	その他	グループ 3 3 橋	グループ 5 101 橋	グループ 5 265 橋

※橋長 100m以上の橋梁を長大橋と設定する。
※その他道路に含まれる緊急避難路線は重要度を 1 つ上げることとする。

1.10.3　管理水準

管理水準は，予防維持管理，事後維持管理，要監視の３通りとしています。(表 1-6)

①健全度Ⅰは，早急に補修する必要がなく定期点検を実施，あるいは要監視

②健全度Ⅱ及びⅢは，交通に支障はないが損傷が進行しているため，補修を検討・実施する予防維持管理

③健全度Ⅳは，著しい損傷が発生しているため早急に架替え・更新等の大規模補修対策を実施する事後維持管理

表 1-6　橋梁の健全度評価区分とグループごとの管理水準

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">省令に基づく
健全性の診断区分</th><th rowspan="2">健全度</th><th colspan="5">管理水準・目標（維持管理手法）</th></tr>
<tr><th>ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1</th><th>ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2</th><th>ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3</th><th>ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4</th><th>ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Ⅰ</td><td rowspan="2">道路橋の機能に支障が生じていない状態</td><td>5</td><td>定期点検</td><td rowspan="2">定期点検</td><td rowspan="2">定期点検</td><td rowspan="2">定期点検</td><td rowspan="2">定期点検</td></tr>
<tr><td>4</td><td>要監視</td></tr>
<tr><td>Ⅱ</td><td>道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。</td><td>3</td><td rowspan="3">予防維持管理
補修検討・実施</td><td rowspan="2">予防維持管理
補修検討・実施</td><td rowspan="2">予防維持管理
補修検討・実施</td><td rowspan="2">予防維持管理
補修検討・実施</td><td rowspan="2">予防維持管理
補修検討・実施</td></tr>
<tr><td>Ⅲ</td><td>道路橋の機能に支障が生じる恐れがあり，早期に措置を講ずべき状態。</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Ⅳ</td><td>道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる恐れが著しく高く，緊急に措置を講ずべき状態。</td><td>1</td><td colspan="5">事後維持管理
架替・更新などの大規模補修対策の実施</td></tr>
</table>

要監視…必要に応じて追跡調査等を実施し，補修検討・補修等を実施する。

2.新技術等の活用方針

2.1　方針

維持管理に係るコスト縮減等に取り組むため，次回の定期点検からすべての橋梁で「広島県長寿命化技術活用制度」の登録技術や国土交通省の「点検支援技術性能カタログ（案）」（令和 3 年 10 月）に記載されている新技術，新技術情報提供システム（NETIS）の登録技術等の活用を検討し，コストの縮減を図ります。

2.2　目標

今後，令和 9 年度までに管理する 476 橋のうち，約 1 割の橋梁で新技術の活用を重点的に検討し，5 年間で約 100 万円のコスト削減を目指します。

3. 費用の縮減に関する具体的な方針

3.1　方針

3.1.1　予防保全型の維持管理への移行

事後保全型の維持管理から予防保全型の維持管理に移行することにより，中長期的な修繕費用の縮減を図ります。

3.1.2　集約化・撤去，機能縮小

迂回路が存在し、集約が可能な橋梁について、令和 9 年度までに 1 橋程度の集約化・撤去を検討し、令和 9 年度までの 5 年間の維持管理費用（橋梁点検費用約 0.4 百万円）のコスト縮減を目指します。

3.2　目標

3.2.1　予防保全型の維持管理への移行

今後 60 年間の橋梁維持管理を，事後保全型から予防保全型に移行し，橋梁の長寿命化を図ることにより，約 3 割（約 30 億円）のコスト縮減が見込まれ，ライフサイクルコスト(LCC)が縮減できます。

また，年度毎の維持管理費用を平準化させることで，財政に集中的な負担をかけません。（図 3-1）

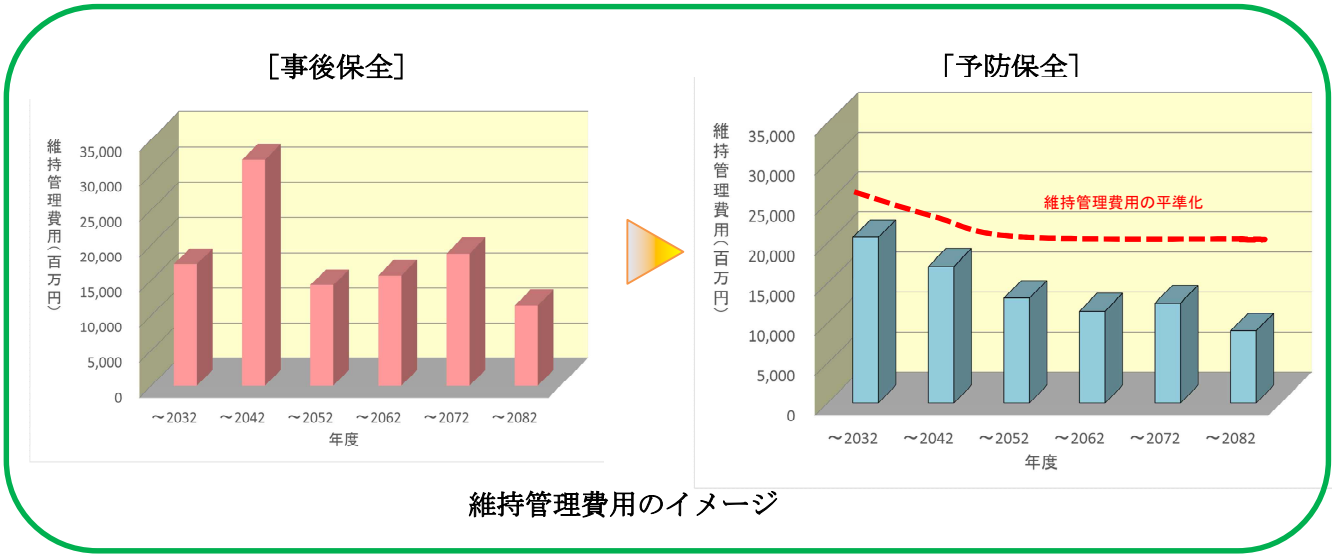

図 3-1　コスト縮減効果グラフ

4. フォローアップ

定期点検により毎年新たに発見される変状に対しては，適宜見直し(フォローアップ)を行います。

また，定期点検結果及び補修工事履歴をデータベースである「アセットマネジメントシステム」に反映させ，適切な施設の維持管理を行います。

5. 個別の構造物ごとの事項

定期点検後の健全度評価，劣化予測，ライフサイクルコストの算定，対策優先順位等を踏まえた廿日市市の橋梁長寿命化修繕計画一覧を別表に示します。

橋梁長寿命化修繕計画一覧

橋梁名	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	所在地	点検年度	診断区分	点検・補修等計画 ●定期点検 ○補修等工事 △調査設計					補修内容(主な措置内容)【予定】	備考欄
									R5	R6	R7	R8	R9		
佐方中橋	2級市道　旧国道線	1970	5.3	12.5	RC橋	廿日市	2020	Ⅱ			●				
可愛橋	2級市道　旧国道線	2006	13.6	8.7	PC橋	廿日市	2017	Ⅰ					●		
御手洗橋	2級市道　旧国道線	1973	21.3	6.3	PC橋	串戸・地御前	2021	Ⅱ				●			
外宮橋	2級市道　旧国道線	1970	5	5.6	RC橋	廿日市	2020	Ⅰ			●				
中榎之浦橋	その他市道　住吉線（広油線）	1988	19.7	6.2	PC橋	本町	2021	Ⅰ				●			
桜尾橋	その他市道　桜尾線	1988	8	7.8	RC橋	桜尾三丁目	2020	Ⅱ			●				
佐方本線1号路線橋	1級市道　佐方本線	1973	3	23.4	BOX	佐方同免	2020	Ⅱ			●				
佐方本線2号路線橋	1級市道　佐方本線	1973	4.9	5.6	BOX	佐方同免	2020	Ⅱ			●				
佐方川１号橋	1級市道　佐方本線	1970	4.5	0.9	鋼橋	佐方本町	2020	Ⅰ			●				
佐方川２号橋	1級市道　佐方本線	1970	4.5	1.9	鋼橋	佐方本町	2020	Ⅰ			●				
佐方中二号橋	1級市道　佐方本線	1988	6	5.3	PC橋	佐方本町	2020	Ⅰ			●				
佐方川３号橋	1級市道　佐方本線	1970	5.2	5.4	RC橋	佐方本町	2020	Ⅱ			●				
佐方川橋	1級市道　佐方本線	1988	5.8	4.6	PC橋	佐方本町	2020	Ⅰ			●				
佐方川４号橋	1級市道　佐方本線	1970	4.9	1.2	RC橋	佐方本町	2020	Ⅱ			●				
佐方川５号橋	1級市道　佐方本線	1970	4.9	1.2	RC橋	佐方本町	2020	Ⅲ			●				補修済(2021年度)
佐方大橋	1級市道　佐方本線	1970	6.3	9.9	RC橋	佐方本町	2020	Ⅱ			●				
佐方川６号橋	1級市道　佐方本線	1970	6.8	2.4	鋼橋	佐方本町	2020	Ⅰ			●				
佐方橋	1級市道　佐方本線	1988	7.6	6.2	PC橋	山陽園	2020	Ⅱ			●				
二重原橋	1級市道　第１路線	1951	7.1	5.1	RC橋	上平良・堂垣内	2021	Ⅱ				●			
森宗橋	1級市道　第１路線	1960	3.3	4.8	RC橋	原・森宗	2020	Ⅰ			●				
下ヶ原橋	1級市道　第１路線	1960	10.8	5.1	PC橋	原・矢ノ先	2020	Ⅱ			●				
第2路線橋	その他市道　第２路線	1960	13.6	4.2	RC橋	上平良・二重原	2020	Ⅱ			●				
大之木跨線道水路橋	その他市道　第３路線	1963	18.3	2.1	鋼橋	新宮二丁目	2018	Ⅰ	●						
可愛川歩道橋	その他市道　第３路線	2003	14.1	1.4	鋼橋	新宮二丁目	2020	Ⅰ			●				
鴨原橋	1級市道　駅屋代線	1987	7.6	10.8	RC橋	城内一丁目	2020	Ⅱ			●				補修済(2013年度)
駅屋代線2号路線橋	1級市道　駅屋代線	1975	5.8	14.3	RC橋	佐方四丁目	2017	Ⅱ					●		
駅屋代線1号橋	1級市道　駅屋代線	1950	2	9.4	RC橋	駅前	2017	Ⅰ					●		補修済(2015年度)
第1大原線路線橋	その他市道　第１大原線	2005	3.8	3	RC橋	上平良・大原	2020	Ⅰ			●				
三浦橋	その他市道　大堂線	1976	15.5	1.2	鋼橋	上平良・堂垣内	2021	Ⅲ				●○		ひび割れ注入 断面修復等	補修済(2010年度)
中平良橋（上り）	1級市道　郡伴線	1959	15.1	4.7	RC橋	上平良・郡塚	2021	Ⅱ				●			
中平良橋（下り）	1級市道　郡伴線	1995	19.2	7	PC橋	上平良・郡塚	2021	Ⅱ				●			
大迫線路線橋	その他市道　大迫線	1965	4	4.6	RC橋	上平良・二重原	2020	Ⅱ			●				補修済(2015年度)
佐方越線1号路線橋	2級市道　佐方越線	1980	3.5	6	RC橋	串戸四丁目4	2020	Ⅰ			●				
七尾橋	2級市道　佐方越線	1995	10	7	PC橋	平良二丁目	2020	Ⅰ			●				
佐方越線4号路線橋	2級市道　佐方越線	1970	4.6	4.2	RC橋	佐方・宮ノ上	2020	Ⅲ			●				補修済(2021年度)
佐方越線5号路線橋	2級市道　佐方越線	1990	4.8	3	RC橋	佐方・宮ノ上	2020	Ⅱ			●				
後田並行線路線橋	その他市道　後田並行線	1970	3	2.7	RC橋	駅前	2017	Ⅰ					●		
中央線路線橋	2級市道　中央線	1970	2.7	6	BOX	上平良・小野	2020	Ⅰ			●				補修済(2020年度)
中央線１号橋	2級市道　中央線	1975	3.4	7	RC橋	上平良字末森	2017	Ⅰ					●		
今田橋	2級市道　第２末森線	1978	16.2	4.7	鋼橋	上平良・堂垣内	2021	Ⅲ			△	●○		未定	補修済(2015年度)
中央橋１	その他市道　第１郡塚線	1975	15	2.3	鋼橋	上平良・伴丈木	2021	Ⅱ				●			
七尾一本橋	その他市道　第２七尾線	1974	15.3	1.5	鋼橋	平良一丁目	2021	Ⅱ				●			
第１道狭線２号路線橋	その他市道　第１道狭線	1970	2.9	6.3	RC橋	新宮二丁目	2020	Ⅱ			●				
中道線路線橋	その他市道　中道線	1960	3.1	5.7	RC橋	串戸四丁目	2017	Ⅲ					●		補修済(2021年度)
的場線1号路線橋	2級市道　的場線	1980	3.8	4.1	RC橋	宮内・的場	2017	Ⅰ					●		
的場線2号路線橋	2級市道　的場線	1980	3.6	9.5	RC橋	宮内・的場	2017	Ⅱ					●		
沢の尾線１号橋	1級市道　沢の尾線	1950	2.8	8.7	RC橋	宮内字新屋敷	2017	Ⅲ				○	●	ひび割れ注入 断面修復等	
鵜出線路線橋	1級市道　宮内更地線	1985	4	7.1	RC橋	宮内・鵜出	2017	Ⅱ					●		
鵜出線１号橋	1級市道　宮内更地線	1985	2.3	29.2	BOX	宮内・鵜出	2017	Ⅱ					●		
串戸橋	その他市道　串戸1号線	1969	6.3	5.5	PC橋	串戸二丁目	2017	Ⅱ					●		
串戸3号線路線橋	その他市道　串戸3号線	1965	6.4	2	鋼橋	串戸二丁目7番	2017	Ⅲ					●		補修済(2016年度)
新屋敷河本線路線橋	2級市道　新屋敷河本線	1975	2.2	7.1	RC橋	串戸六丁目六番	2017	Ⅱ					●		
砂原大橋	2級市道　国広線	1988	24.1	7	PC橋	宮内・砂原	2021	Ⅰ				●			
国広橋	2級市道　国広線	1988	20.1	9	PC橋	宮内・国広	2021	Ⅰ				●			
佐原田橋	2級市道　佐原田線	1990	18.8	7.7	PC橋	宮内・佐原田	2021	Ⅰ				●			

橋梁名	路線名	架設年度	橋長（m）	幅員（m）	橋種	所在地	点検年度	診断区分	点検・補修等計画 ●定期点検 ○補修等工事 △調査設計					補修内容（主な措置内容）【予定】	備考欄
									R5	R6	R7	R8	R9		
沖の河原橋	その他市道　沖の河原橋線	1974	17.8	4.8	鋼橋	宮内・石原	2021	Ⅱ				●			
第2明石橋	その他市道　野稲原線	1960	6.8	3.9	ＲＣ橋	宮内・明石	2017	Ⅱ					●		
野稲原線２号路線橋	その他市道　野稲原線	1985	2.7	4.1	ＲＣ橋	宮内・明石	2017	Ⅰ					●		
野稲原線３号路線橋	その他市道　野稲原線	1960	2.4	4.5	ＲＣ橋	宮内・明石	2017	Ⅲ					●		補修済（2017年度）
国実橋	2級市道　旧県道線	1970	6.5	4.6	ＲＣ橋	原・国実	2017	Ⅱ					●		
大迫線1号路線橋	その他市道　大迫線	1960	8	2.7	鋼橋	原・上川末	2017	Ⅲ				○	●	未定	
大迫線2号路線橋	その他市道　大迫線	1985	4.7	2	ＲＣ橋	原・上川末	2017	Ⅰ					●		
大迫線3号路線橋	その他市道　大迫線	1985	6	4.8	ＲＣ橋	原・上川末	2017	Ⅱ					●		
大歳橋１	その他市道　大迫線	1988	9.5	8.2	ＰＣ橋	原・上川末	2021	Ⅱ				●			
大迫線4号路線橋	その他市道　大迫線	1970	3.7	4.4	ＲＣ橋	原・上川末	2017	Ⅰ					●		
川末橋	その他市道　下切線	1980	8.4	4.6	ＰＣ橋	原・上川末	2017	Ⅱ					●		
郷呂橋	その他市道　橋中線	1985	9.2	4.7	ＰＣ橋	原・橋本	2017	Ⅱ					●		
神路橋	その他市道　神路線	1965	6.8	4.6	ＲＣ橋	原・長谷	2017	Ⅱ					●		
牛池線１号路線橋	その他市道　牛池線	1970	6.2	5	ＲＣ橋	市原・後畑	2017	Ⅱ					●		
牛池線２号路線橋	その他市道　牛池線	1975	5.2	3	ＲＣ橋	市原・後畑	2017	Ⅱ					●		
牛池線３号路線橋	その他市道　牛池線	1975	3	4	BOX	市原・後畑	2017	Ⅲ					●		補修済（2021年度）
牛池線４号路線橋	その他市道　牛池線	1975	5.8	3.4	ＲＣ橋	市原・後畑	2017	Ⅱ					●		
品川橋	その他市道　品川線	2001	9.2	2	鋼橋	市原・後畑	2017	Ⅰ					●		
宮内越通り橋	その他市道　宮内越通り線	1985	39.1	4.8	鋼橋	宮内・大方	2020	Ⅱ			●				
北山橋１	その他市道　宮内越通り線	1995	24.4	7.9	ＰＣ橋	宮内・新屋敷	2020	Ⅱ			●				
北山橋歩道橋	その他市道　宮内越通り線	1995	24.3	2.3	ＰＣ橋	宮内・新屋敷	2021	Ⅱ				●			
南町幹線路線橋	その他市道　南町幹線	1965	3.4	2.8	ＲＣ橋	地御前三丁目２５番	2017	Ⅱ					●		
木上通り線２号路線橋	2級市道　木上通り線	1980	2.8	9.3	ＲＣ橋	地御前・木上	2017	Ⅲ					●		補修済（2017年度）
木上通り線３号路線橋	2級市道　木上通り線	1980	2.8	4	ＲＣ橋	地御前・木上	2017	Ⅱ					●		
木上通り線４号路線橋	2級市道　木上通り線	1980	2.5	4.3	ＲＣ橋	地御前・木上	2017	Ⅱ					●		
木上通り線５号橋	2級市道　木上通り線	1980	3.4	8	BOX	地御前・木上	2017	Ⅱ					●		
木上通り線６号橋	2級市道　木上通り線	1980	7.5	3.6	ＲＣ橋	地御前・木上	2017	Ⅱ					●		
第３城ヶ谷線１号路線橋	その他市道　第３城ヶ谷線	1965	9.6	5.7	ＲＣ橋	宮内・明石	2017	Ⅱ					●		
第３城ヶ谷線２号路線橋	その他市道　第３城ヶ谷線	1965	7	3.7	ＲＣ橋	宮内・明石	2021	Ⅱ				●			
阿品陸橋歩道橋	その他市道　鼓ヶ浜第１号線	1971	72.5	1.9	鋼橋	阿品三丁目	2017	Ⅱ					●		
衣越こ線道路橋	その他市道　衣越線	1974	16.2	7.9	ＰＣ橋	六本松一丁目	2021	Ⅲ	○			●		ひび割れ注入 断面修復等	
鼓ヶ浜橋	その他市道　鼓ヶ浜２号線	1971	13.4	20.8	ＰＣ橋	阿品三丁目	2021	Ⅱ				●			
串戸畑口線１号橋	1級市道　串戸畑口線	1975	2.4	14.1	BOX	宮内字的場	2017	Ⅰ					●		
長橋橋	その他市道　長橋線	1990	15.8	8.6	ＰＣ橋	原・長野	2021	Ⅱ				●			
野坂こ線道路橋	その他市道　野坂２号線	1974	15.7	6.8	ＰＣ橋	六本松一丁目	2021	Ⅱ				●			
鹿ノ子２号陸橋	1級市道　地御前対厳山線	1978	10.2	9.5	ＰＣ橋	地御前四丁目	2021	Ⅱ				●			
鹿ノ子陸橋	1級市道　地御前対厳山線	1978	36.2	9	鋼橋	地御前	2021	Ⅲ	△		○	●		ひび割れ注入 断面修復等	補修済（2011年度）
鹿ノ子３号陸橋	1級市道　地御前対厳山線	1978	9.2	9	ＰＣ橋	地御前四丁目	2021	Ⅱ				●			
新幹線側道２号線１号橋	その他市道　新幹線側道２号線	1974	2.6	11.8	ＲＣ橋	串戸五丁目	2017	Ⅱ					●		
清末大谷線２号路線橋	その他市道　清末大谷線	1975	7.3	3.8	ＲＣ橋	佐方同免	2018	Ⅱ	●						
田尻橋	その他市道　沖山田尻線	1980	11.6	6	ＰＣ橋	阿品三丁目	2017	Ⅱ					●		
沖山田尻線２号橋	その他市道　沖山田尻線	1971	4.7	6.6	BOX	阿品一丁目	2018	Ⅲ	●						補修済（2021年度）
沖山田尻線路線橋	その他市道　沖山田尻線	1971	6.4	8.5	ＰＣ橋	阿品一丁目	2018	Ⅲ	●						補修済（2021年度）
阿品横幹線２号路線橋	2級市道　阿品横幹線	1970	2	8.6	ＲＣ橋	阿品二丁目	2017	Ⅱ					●		
阿品横幹線３号路線橋	2級市道　阿品横幹線	1970	2.5	6.5	ＲＣ橋	阿品一丁目	2017	Ⅱ					●		
下榎之浦橋	その他市道　下平良堤防線	1981	34	8.3	鋼橋	下平良一丁目	2021	Ⅱ				●			
打越橋	2級市道　嘉永縦１号線	1970	2	5.5	ＲＣ橋	一丁目１８番	2018	Ⅲ	●		○			ひび割れ注入 断面修復等	
城内３号線路線橋	その他市道　城内３号線	1970	2.2	6.5	ＲＣ橋	城内一丁目	2018	Ⅱ	●						
樫原橋	その他市道　樫原住宅線	1980	8.5	4.6	ＰＣ橋	市原・橋本	2018	Ⅰ	●						
中小路橋	その他市道　中小路宇治久保線	1980	8.9	4.6	ＰＣ橋	市原・矢ノ先	2018	Ⅱ	●						
西広島バイパス側道１号橋	他市道　西広島バイパス側道１	1973	5.9	5	ＲＣ橋	佐方同免	2021	Ⅱ				●			
西広島バイパス側道２号橋	他市道　西広島バイパス側道１	1973	5.7	5	ＲＣ橋	佐方大谷	2018	Ⅱ	●						
西広島バイパス側道３号橋	他市道　西広島バイパス側道１	1973	6.2	7	ＲＣ橋	佐方大谷	2018	Ⅱ	●						
西広島バイパス側道４号橋	他市道　西広島バイパス側道２	1973	3	5.7	BOX	佐方・大谷	2018	Ⅱ	●						
西広島バイパス北側橋	他市道　西広島バイパス側道８	1973	16.6	10.3	鋼橋	上平良・伴丈木	2021	Ⅱ				●			

橋梁名	路線名	架設年度	橋長（m）	幅員（m）	橋種	所在地	点検年度	診断区分	点検・補修等計画 ●定期点検 ○補修等工事 △調査設計					補修内容（主な措置内容）【予定】	備考欄
									R5	R6	R7	R8	R9		
広岩道路側道３号線１号橋	その他市道　広岩道路側道３号線	1986	2.3	21.6	BOX	六本松一丁目	2018	Ⅰ	●						
広岩道路側道９号線１号路線橋	その他市道　広岩道路側道９号線	1986	3.1	6.6	ＲＣ橋	宮内・西鰌出	2018	Ⅱ	●						
広岩道路側道１０号線１号橋	その他市道　広岩道路側道１０号	1986	2.6	18.8	ＲＣ橋	宮内佐原田	2018	Ⅱ	●						
宮前橋	その他市道　城内八幡神社線	1988	5.1	4.8	ＰＣ橋	佐方・城内	2020	Ⅰ			●				
城内支線路線橋	その他市道　城内線支線	1988	4.4	4	ＲＣ橋	佐方・城内	2020	Ⅰ			●				
可愛ヶ丘１号線路線橋	その他市道　可愛ヶ丘１号線	1975	5.3	6.8	ＲＣ橋	上平良・堂垣内	2018	Ⅱ	●						
大方橋	その他市道　大方金剛寺線	1995	23	9.8	ＰＣ橋	串戸五丁目	2021	Ⅱ				●			
宮内第2橋	その他市道　宮迫高砂線	1986	34.2	14.5	ＲＣ橋	宮園九丁目	2020	Ⅱ			●				補修済（2014年度）
宮内第3橋	その他市道　宮迫高砂線	1986	32.9	14.5	ＲＣ橋	四季が丘九丁目	2020	Ⅱ			●				補修済（2014年度）
石原橋	その他市道　宮迫高砂線	1985	19.5	16.8	ＰＣ橋	宮内・石原	2021	Ⅲ		○		●		ひび割れ注入 断面修復等	
上平良橋	その他市道　上平良宮内幹線	1984	14.8	8	ＰＣ橋	上平良・大原	2021	Ⅰ				●			
第2二重原橋	その他市道　上平良宮内幹線	1984	14.7	8	ＰＣ橋	上平良・二重原	2021	Ⅱ				●			
国実宇治久保線路線橋	その他市道　国実宇治久保線	1990	2.4	6.5	ＲＣ橋	市原・宇治久保	2018	Ⅰ	●						
国実宇治久保線２号橋	その他市道　国実宇治久保線	1990	2.4	16.4	ＲＣ橋	市原・宇治久保	2018	Ⅰ	●						
国実宇治久保線３号橋	その他市道　国実宇治久保線	1990	2.4	18.6	ＲＣ橋	市原・宇治久保	2018	Ⅰ	●						
国実宇治久保線４号橋	その他市道　国実宇治久保線	1990	2.4	6.7	ＲＣ橋	市原・宇治久保	2018	Ⅰ	●						
大幸線路線橋	その他市道　大幸線	1985	2.8	4.4	ＲＣ橋	宮内・大幸	2018	Ⅰ	●						
阿品台山の手６号線１号橋	その他市道　阿品台山の手６号線	1978	2.9	4.6	BOX	阿品台西	2018	Ⅱ	●						
鰆浜８号路線橋	その他市道　鰆浜８号路線	1975	2	6.6	ＲＣ橋	阿品一丁目	2018	Ⅱ	●						
宮内第1橋	その他市道　宮園4-1号線	1986	32.9	12.5	ＲＣ橋	宮園四丁目	2020	Ⅱ			●				補修済（2015年度）
同免大谷線１号橋	その他市道　同免大谷線	1990	3.5	6	BOX	佐方	2018	Ⅱ	●						
第2畑口橋	その他市道　山陽道側道1号線	1986	11.2	6	ＰＣ橋	宮内・西畑口	2021	Ⅱ				●			
西畑口橋	その他市道　畑口線	1985	12.5	4.6	ＰＣ橋	宮内・西畑口	2021	Ⅰ				●			
大原橋	その他市道　山陽道側道６号線	1986	2.5	5.8	BOX	上平良・大原	2018	Ⅰ	●						
四郎峠跨道橋	その他市道　東鰌出幹線	1982	63.5	7.4	ＰＣ橋	宮内・西鰌出	2019	Ⅱ		●					補修済（2015年度）
国広一本橋	その他市道　御手洗川１号線	1975	20.8	1.4	鋼橋	宮内・国広	2021	Ⅰ				●			
佐原田一本橋	その他市道　御手洗川１号線	1975	16.1	1.9	鋼橋	宮内・佐原田	2021	Ⅰ				●			
長野橋	その他市道　長谷線	1965	8.1	6.8	ＲＣ橋	市原・長谷	2018	Ⅱ	●						
長谷橋	その他市道　長谷線	1946	6.5	4.6	ＲＣ橋	市原・長谷	2018	Ⅱ	●						補修済（2014年度）
第３大之木線路線橋	その他市道　第３大之木線	1975	2.4	7.9	ＲＣ橋	平良二丁目	2018	Ⅱ	●						
旧後畑幹線１号路線橋	その他市道　旧後畑幹線	1980	4.8	4.7	ＲＣ橋	市原・後畑	2018	Ⅰ	●						
旧後畑幹線２号路線橋	その他市道　旧後畑幹線	1980	2.3	4.6	BOX	市原・後畑	2018	Ⅰ	●						
玉野井橋	1級市道　地御前宮内線	2007	23.8	14.1	ＰＣ橋	宮内・砂原	2021	Ⅱ				●			
平良大橋	その他市道　平良佐方線	1994	16.5	42.5	ＰＣ橋	平良二丁目	2021	Ⅱ				●			
七尾陸橋	その他市道　平良佐方線	1999	83	24.5	ＰＣ橋	平良二丁目	2021	Ⅱ				●			
伴丈木郡塚橋	その他市道　第２中央線	2006	20.9	10.5	ＰＣ橋	上平良	2021	Ⅰ				●			
木上通り１号支線１号橋	その他市道　木上通り１号支線	1980	2.6	5.7	ＲＣ橋	地御前・木上	2018	Ⅲ	●						補修済（2018年度）
新宮一本橋	その他市道　新宮須賀線	2000	13.3	1.3	鋼橋	可愛新宮一丁目	2017	Ⅰ					●		
峰高河本２号支線１号橋	その他市道　峰高河本２号支線	1975	2	4	ＲＣ橋	串戸六丁目	2018	Ⅱ	●						
阿品陸橋（阿品駅通り線）	1級市道　阿品駅通り線	1970	119	13.1	ＲＣ橋	阿品	2017	Ⅲ		△		○	●	ひび割れ注入 断面修復等	
阿品陸橋（鼓ヶ浜第1号線）	その他市道　鼓ヶ浜第１号線	1970	132	9.1	ＲＣ橋	阿品	2017	Ⅲ		○			●	ひび割れ注入 断面修復等	
峰高河本線１号床版橋	その他市道　峰高河本線	1978	8.5	3.4	ＲＣ橋	峰高	2020	Ⅱ			●				
峰高河本線１号ボックス橋	その他市道　峰高河本線	1978	5	16	BOX	峰高	2020	Ⅱ			●				
阿品1号路線1号支線橋	その他市道　阿品1号路線1号支線	2016	2.4	12.5	ＲＣ橋	阿品	2018	Ⅰ	●						
阿品2号路線2号支線橋	その他市道　阿品2号路線2号支線	2015	4.5	12.8	ＲＣ橋	阿品	2018	Ⅰ	●						
阿品2号路線1号支線橋	その他市道　阿品2号路線1号支線	2011	4	5.5	ＲＣ橋	阿品	2018	Ⅱ	●						
佐方1号支線1号橋	その他市道　佐方1号支線	2014	4.8	5.4	ＲＣ橋	佐方	2018	Ⅰ	●						
佐方越1号支線1号路線橋	その他市道　佐方越1号支線	2009	6.2	5.5	ＲＣ橋	佐方	2018	Ⅰ	●						
第1道狭線3号路線橋	その他市道　第１道狭線	1988	3.3	7.4	ＲＣ橋	新宮	2018	Ⅰ	●						
田屋1号線路線橋	その他市道　田屋１号路線	0	2.4	4.9	BOX	地御前	2018	Ⅰ	●						
栩谷線路線橋	その他市道　栩谷線	1175	12	1.7	鋼橋	原	2018	Ⅱ	●						
神路橋	その他市道	1952	15.1	4.9	ＲＣ橋	上平良	2017	Ⅰ					●		補修済（2017年度）
上平橋	その他市道	1930	7	6	ＲＣ橋	上平良	2017	Ⅰ					●		補修済（2017年度）
大原橋	その他市道	1965	5	6.5	ＲＣ橋	上平良	2017	Ⅰ					●		
河原橋	その他市道	1935	4.2	6.9	ＲＣ橋	上平良	2017	Ⅰ					●		

橋梁名	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	所在地	点検年度	診断区分	点検・補修等計画 ●定期点検 ○補修等工事 △調査設計					補修内容(主な措置内容)【予定】	備考欄
									R5	R6	R7	R8	R9		
境橋	その他市道	1923	2.7	6.3	RC橋	上平良	2017	Ⅱ					●		
橋本橋	その他市道	1952	7.4	5.1	RC橋	原	2017	Ⅰ					●		
内野橋	1級市道　上大町大山線	1965	7.5	4.7	PC橋	玖島	2019	Ⅰ		●					
昭和橋	1級市道　峠中組越峠線	2007	31	6.2	PC橋	峠	2019	Ⅰ		●					
石迫橋	1級市道　峠中組越峠線	1972	7.6	4.5	RC橋	峠	2019	Ⅰ		●					
大宅下橋	1級市道　峠中組越峠線	1960	6.4	1.9	鋼橋	峠	2019	Ⅰ		●					
河津原橋	1級市道　廿日市津和野線	1984	19.5	8	PC橋	河津原	2019	Ⅲ		●○				ひび割れ注入 断面修復等	
千代田橋	1級市道　廿日市津和野線	1979	16	5	鋼橋	河津原	2019	Ⅰ		●					補修済(2016年度)
尾上乙丸線1号橋	1級市道　尾上乙丸線	1950	2.5	3.8	RC橋	友田	2019	Ⅰ		●					補修済(2016年度)
尾上乙丸線2号橋	1級市道　尾上乙丸線	1995	2.3	6.5	BOX	友田	2019	Ⅰ		●					
林橋	1級市道　津田支線	1965	8.7	5	RC橋	津田	2019	Ⅱ		●					
津田橋	1級市道　津田支線	1965	7.8	6.4	RC橋	津田	2019	Ⅱ		●					
白河橋	1級市道　戸屋原白河線	1963	32	4.4	RC橋	浅原	2019	Ⅲ	△	○				撤去	
戸屋原白河線1号橋	1級市道　戸屋原白河線	1960	2.4	4.7	RC橋	浅原	2019	Ⅱ		●					
岩橋	2級市道　川上瀧谷線	1980	3.7	4.7	RC橋	玖島	2019	Ⅱ		●					
曽根橋	2級市道　川上瀧谷線	1980	5.6	4.7	RC橋	玖島	2019	Ⅱ		●					
川上龍谷線1号橋	2級市道　川上瀧谷線	1990	5.2	4.9	BOX	玖島	2019	Ⅰ		●					
田川橋	2級市道　川上瀧谷線	1990	3.3	4.8	RC橋	玖島	2019	Ⅰ		●					
共栄橋	2級市道　吉末西山線	1975	12.5	4.7	PC橋	玖島	2019	Ⅱ		●					
西山橋	2級市道　吉末西山線	1974	8	4.7	PC橋	玖島	2019	Ⅱ		●					
鯉山橋	2級市道　吉末西山線	1975	9.7	3.6	RC橋	玖島	2019	Ⅲ		●○				ひび割れ注入 断面修復等	
馬乗橋	2級市道　楢原日焼田線	1987	24	4.8	PC橋	玖島	2019	Ⅱ		●					
大歳橋２	2級市道　楢原日焼田線	1985	13.6	4.9	PC橋	玖島	2019	Ⅰ		●					
日焼田橋	2級市道　楢原日焼田線	1983	30.5	4.8	PC橋	玖島	2019	Ⅱ		●					
河本橋	2級市道　河本内山本線	1985	9.9	4.7	PC橋	津田	2019	Ⅰ		●					
須川田橋	2級市道　須川田線	1974	45	4.6	鋼橋	浅原	2018	Ⅱ	●						補修済(2010年度)
猪之迫橋１	2級市道　猪之迫線	1960	6.4	3.7	RC橋	浅原	2019	Ⅱ		●					
東ヶ迫橋	2級市道　猪之迫線	1955	6.3	3.3	RC橋	浅原	2019	Ⅲ		●	○			ひび割れ注入 断面修復等	
小田原橋	2級市道　成ヶ原小田原線	1970	3.2	6.9	RC橋	浅原	2019	Ⅱ		●					
上峠橋	2級市道　上峠線	1965	6	4	RC橋	虫所山	2019	Ⅱ		●					
三島原線1号橋	2級市道　三島原線	1990	2.6	4.2	BOX	中道	2019	Ⅰ		●					
中平橋	その他市道　平谷内野線	1991	6.4	4.9	PC橋	玖島	2019	Ⅰ		●					
黒草橋	その他市道　吉末黒草線	1970	6.6	4.6	RC橋	玖島	2019	Ⅱ		●					
黒草2号橋	その他市道　吉末黒草線	1970	6	3.7	鋼橋	玖島	2019	Ⅲ		●					補修済(2019年度)
景浦橋	その他市道　中村景浦線	1973	10.1	4.6	PC橋	玖島	2019	Ⅱ		●					
日浦橋	その他市道　一丁田日浦線	1973	10.9	4.7	PC橋	玖島	2019	Ⅱ		●					
一丁田橋	その他市道　日浦釜谷線	1971	8.5	4.7	PC橋	玖島	2020	Ⅱ			●				
天堂橋	その他市道　正ノ原天堂線	1977	33.8	4.7	PC橋	玖島	2018	Ⅰ	●						補修済(2017年度)
大下橋	その他市道　三和砂谷線	1974	6.1	4.7	RC橋	永原	2020	Ⅰ			●				補修済(2018年度)
井出谷橋	その他市道　井出谷線	1960	8.4	4.4	RC橋	永原	2017	Ⅱ					●		
井出谷2号橋	その他市道　井出谷線	1960	4.1	4	RC橋	永原	2020	Ⅱ			●				
井出谷3号橋	その他市道　井出谷線	1960	3.6	4.1	RC橋	永原	2020	Ⅰ			●				
井出谷4号橋	その他市道　井出谷線	1960	2.9	4	RC橋	永原	2020	Ⅱ			●				
大久保橋	その他市道　永原大久保線	1963	18.3	2	鋼橋	永原	2020	Ⅲ			●				補修済(2022年度)
河津原1号橋	その他市道　河津原正念寺線	1968	16.5	3.1	鋼橋	河津原	2020	Ⅱ			●				補修済(2012年度)
河津原2号橋	その他市道　河津原正念寺線	1969	16	2.5	鋼橋	河津原	2020	Ⅰ			●				補修済(2013年度)
溝路橋	その他市道　友田中小路線	1978	11.5	3.8	PC橋	河津原	2020	Ⅱ			●				
安井原橋	その他市道　安井原冷川線	1962	3.2	6.8	BOX	浅原	2020	Ⅰ			●				補修済(2014年度)
猪之迫橋２	その他市道　安井原冷川線	1962	5	4	RC橋	浅原	2020	Ⅰ			●				
冷川橋	その他市道　安井原冷川線	1962	8.7	4.7	RC橋	浅原	2020	Ⅱ			●				
中山谷南ヶ原線1号橋	その他市道　中山谷南ヶ原線	1985	4.4	4.8	BOX	河津原	2020	Ⅰ			●				
助藤線1号橋	その他市道　助藤線	1980	3.3	4	BOX	虫所山	2020	Ⅰ			●				
神社橋	その他市道　所山鍋谷線	1960	28.4	2.9	RC橋	所山	2020	Ⅰ			●				補修済(2020年度)
上小原橋	その他市道　小原ｱｰﾁｪﾘｰ線	2000	2.6	8	BOX	津田	2020	Ⅰ			●				
下市橋	その他市道　下市槻ヶ峠線	1963	5.1	2.9	RC橋	津田	2020	Ⅱ			●				

橋梁名	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	所在地	点検年度	診断区分	点検・補修等計画 ●定期点検 ○補修等工事 △調査設計					補修内容(主な措置内容)【予定】	備考欄
									R5	R6	R7	R8	R9		
別府橋１	その他市道　下市槇ヶ峠線	1965	9.6	3.9	鋼橋	津田	2020	Ⅲ		○	●			塗装塗替等	
林田橋	その他市道　下市槇ヶ峠線	1965	2.7	4.1	ＲＣ橋	津田	2020	Ⅱ			●				
上市橋	その他市道　上市線	1985	12	4.7	ＰＣ橋	津田	2020	Ⅱ			●				
八幡迫橋	その他市道　八幡迫線	1970	7	4	ＲＣ橋	津田	2020	Ⅱ			●				
小原橋	その他市道　小原砂田線	1972	11	4.6	ＰＣ橋	津田	2020	Ⅲ	△	○				撤去	
中小原橋	その他市道　横矢小原線	1974	9.4	4.7	ＰＣ橋	津田	2020	Ⅱ			●				
西花上橋	その他市道　横矢小原線	1974	10.3	4.7	鋼橋	津田	2020	Ⅱ			●				
花上橋	その他市道　松ヶ峠花上線	1965	8.4	4.4	ＲＣ橋	津田	2020	Ⅱ			●				
松ヶ峠橋	その他市道　松ヶ峠線	1965	2.6	3.1	ＲＣ橋	津田	2020	Ⅱ			●				
百合野線1号橋	その他市道　百合野線	1960	2.1	3.6	ＲＣ橋	津田	2020	Ⅱ			●				
百合野線2号橋	その他市道　百合野線	1960	2.1	4.1	ＲＣ橋	津田	2020	Ⅰ			●				
河本郷支線1号橋	その他市道　河本郷支線	1975	2.1	12	ＲＣ橋	津田	2020	Ⅰ			●				
上河本橋	その他市道　河本支線	1950	2.9	5	石橋	津田	2020	Ⅰ			●				
田代橋	その他市道　田代線	1971	64	4.5	鋼橋	津田	2017	Ⅱ					●		補修済(2016年度)
河津下中組線1号橋	その他市道　河津下中組線	1970	2.4	4.3	BOX	友田	2020	Ⅱ			●				
みのり橋	その他市道　樽川線	1955	10.7	3.4	ＲＣ橋	津田	2021	Ⅲ				●○		ひび割れ注入 断面修復等	
河津上中組線1号橋	その他市道　河津上中組線	1970	2.4	5.4	ＲＣ橋	友田	2020	Ⅰ			●				
戸屋原橋	その他市道　南戸屋原線	2007	48.5	3.7	鋼橋	浅原	2020	Ⅱ			●				
上戸屋原橋	その他市道　南戸屋原線	1970	60	2.2	鋼橋	浅原	2020	Ⅲ			●	○		未定	
和田橋	その他市道　向原白河線	2002	12	6.2	ＰＣ橋	浅原	2020	Ⅱ			●				
安井原線1号橋	その他市道　安井原線	1975	13.7	6.8	ＲＣ橋	浅原	2020	Ⅱ			●				
安井原線2号橋	その他市道　安井原線	1975	6	7	ＲＣ橋	浅原	2020	Ⅱ			●				
安井原線3号橋	その他市道　安井原線	1980	7.2	6	ＰＣ橋	浅原	2020	Ⅱ			●				
上本谷1号橋	その他市道　河津上本谷線	1965	7.9	3.2	鋼橋	河津原	2021	Ⅰ				●			
上本谷2号橋	その他市道　河津上本谷線	1965	9.9	3.2	鋼橋	河津原	2021	Ⅰ				●			
針山4号橋	その他市道　針山線	1960	3.8	3.4	ＲＣ橋	中道	2020	Ⅱ			●				
針山1号橋	その他市道　針山線	1960	8.3	5.2	ＲＣ橋	中道	2020	Ⅲ			●○			ひび割れ注入 断面修復等	
針山2号橋	その他市道　針山線	1960	3.8	3.9	ＲＣ橋	中道	2020	Ⅱ			●				
針山3号橋	その他市道　針山線	1960	2.9	3.4	ＲＣ橋	中道	2020	Ⅰ			●				
針山10号橋	その他市道　針山線	1960	2.5	4.1	ＲＣ橋	中道	2020	Ⅱ			●				
下小原橋	その他市道　小原郷線	1975	3.6	3.3	ＲＣ橋	津田	2020	Ⅱ			●				
大宅橋	その他市道　峠下大宅線	1980	8.5	4.6	ＰＣ橋	峠	2020	Ⅱ			●				
大宅2号橋	その他市道　峠下大宅線	2000	2.8	36	BOX	峠	2020	Ⅰ			●				
掛ヶ原岩倉線1号橋	その他市道　掛ヶ原岩倉線	1960	3	4.1	ＲＣ橋	津田	2020	Ⅰ			●				
佐伯河本線1号橋	その他市道　佐伯河本線	1965	4.4	3.2	ＲＣ橋	津田	2020	Ⅰ			●				
神田橋	その他市道　奥迫線	1965	8.6	4.4	ＲＣ橋	津田	2020	Ⅲ			●				補修済(2020年度)
兼康橋	その他市道　兼康線	1970	9.6	3.6	鋼橋	玖島	2020	Ⅲ			●				補修済(2022年度)
勝成橋	その他市道　猪の子線	2003	13	6.2	ＰＣ橋	浅原	2020	Ⅰ			●				
猪之子橋	その他市道　猪の子線	1970	6.5	6.3	ＲＣ橋	津田	2019	Ⅱ		●					
峠東谷線1号橋	その他市道　峠東谷線	2000	3.2	9.1	BOX	峠	2019	Ⅰ		●					
大向井橋	その他市道　岩組大向井線	1978	30.8	4.7	ＰＣ橋	友田	2021	Ⅱ				●			
岩組大向井線1号橋	その他市道　岩組大向井線	1980	2.4	13.1	ＲＣ橋	友田	2019	Ⅱ		●					
飯山線1号橋	その他市道　飯山線	1960	5.4	4	ＲＣ橋	飯山	2019	Ⅰ		●					
いわや橋	その他市道　飯山線	1960	6.5	5.6	ＲＣ橋	飯山	2019	Ⅱ		●					
北山橋２	その他市道　佐伯北山線	1960	3.6	4.4	ＲＣ橋	栗栖	2019	Ⅰ		●					
上北山1号橋	その他市道　上北山線	1960	4.1	3.9	ＲＣ橋	栗栖	2019	Ⅱ		●					
上北山3号橋	その他市道　上北山線	1960	2	4.6	ＲＣ橋	栗栖	2019	Ⅱ		●					
上北山4号橋	その他市道　上北山線	1960	4.2	4.5	ＲＣ橋	栗栖	2019	Ⅰ		●					
上中組小坂1号線1号橋	その他市道　上中組小坂1号線	1965	2.3	5.3	ＲＣ橋	玖島	2019	Ⅰ		●					
下北山橋	その他市道　下北山線	1960	10.5	4.4	ＲＣ橋	栗栖	2017	Ⅲ			△	○	●	未定	
向井原橋	その他市道　向原南線	2007	42.5	4.8	ＰＣ橋	浅原	2021	Ⅰ				●			
大谷線1号橋	その他市道　大谷線	1965	4	3.8	ＲＣ橋	浅原	2019	Ⅰ		●					
橋桁線1号橋	その他市道　橋桁線	1985	2.8	4	ＲＣ橋	友田	2019	Ⅰ		●					
岩倉温泉橋	その他市道　岩倉ロッジ線	1965	44	11.5	ＲＣ橋	津田	2021	Ⅲ	△	○		●		一部撤去 断面修復等	
乙丸渡ノ瀬線1号橋	その他市道　乙丸渡ノ瀬線	1985	3.8	5.7	ＲＣ橋	友田	2019	Ⅰ		●					

橋梁名	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	所在地	点検年度	診断区分	点検・補修等計画 ●定期点検 ○補修等工事 △調査設計					補修内容(主な措置内容)【予定】	備考欄
									R5	R6	R7	R8	R9		
野地橋	その他市道　野地上栗栖線	1964	36	6.8	RC橋	栗栖	2020	Ⅱ			●				補修済(2013年度)
湯の谷橋	その他市道　下北山1号線	1979	30.1	4.7	PC橋	栗栖	2021	Ⅱ				●			補修済(2017年度)
飯山下線1号橋	その他市道　飯山下線	1965	3.4	4.4	RC橋	飯山	2019	Ⅱ		●					
桧の迫橋	その他市道　桧之迫古畑線	1975	12.7	7.8	RC橋	津田	2020	Ⅰ			●				補修済(2020年度)
乙丸支線1号橋	その他市道　乙丸支線	1970	2.7	5.7	RC橋	友田	2019	Ⅰ		●					
幸光橋	その他市道　堀ヶ迫線	1990	12.8	6	PC橋	津田	2017	Ⅱ					●		
佐伯工業団地本線2号橋	その他市道　佐伯工業団地本線	1992	2.6	13	BOX	峠	2019	Ⅰ		●					
橋桁支線1号橋	その他市道　橋桁支線	1995	2.6	7.2	RC橋	友田	2019	Ⅰ		●					
越峠橋	その他市道　大向井越峠線	1980	5	3.6	RC橋	友田	2019	Ⅱ		●					
大虫1号線１号橋	その他市道　大虫1号線	1970	4.9	4	RC橋	虫所山	2019	Ⅰ		●					
大虫1号線2号橋	その他市道　大虫1号線	1970	5.4	3.5	RC橋	虫所山	2019	Ⅱ		●					
八千代橋	その他市道　下栗栖線	1961	32	3.7	RC橋	栗栖	2021	Ⅱ				●			補修済(2010年度)
市井原橋(2050)	国道　１８６号	1962	52.7	6	PC橋	浅原	2020	Ⅲ			●○			ひび割れ注入 断面修復等	
越峠線1号橋	その他市道　越峠線	0	2.2	9	BOX	峠	2018	Ⅰ	●						
下中組1号線1号橋	その他市道　下中組1号線	2015	2	5.3	RC橋	永原	2018	Ⅰ	●						
道秀原支線1号橋	その他市道　道秀原支線	1996	2.1	8	RC橋	津田	2018	Ⅱ	●						
光が丘南7号線1号橋	その他市道　光が丘南7号線	1990	2.9	3.1	RC橋	永原	2018	Ⅰ	●						
八幡迫支線1号橋	その他市道　八幡迫支線	0	4	5	RC橋	津田	2018	Ⅰ	●						
峠中央橋	その他市道　千代田中央1号線	2009	26.1	5.5	鋼橋	峠	2018	Ⅰ	●						
道祖ヶ原線1号橋	その他市道　道祖ヶ原線	0	26.8	2.5	鋼橋	中道	2018	Ⅱ	●						
折休橋	その他市道　鹿の打線	1963	25.2	3.1	RC橋	虫所山	2018	Ⅱ	●						
桧木尾橋	その他市道　柴尾線	1972	20.5	3.1	鋼橋	津田	2018	Ⅱ	●						
横矢橋	その他市道　沖横矢線	1966	10.1	2.6	鋼橋	津田	2021	Ⅲ	○			●		架け替え	
郷之瀬橋	1級市道　田中原妙音寺原線	1973	45.1	4.2	鋼橋	田中原	2019	Ⅰ		●					
猿猴橋	1級市道　石原田中原線	1969	53.1	5.7	鋼橋	石原	2019	Ⅱ		●					
石原田中原線1号橋	1級市道　石原田中原線	1974	4.5	5.5	BOX	石原	2019	Ⅰ		●					
石原田中原線2号橋	1級市道　石原田中原線	2000	5.2	4.8	BOX	田中原	2019	Ⅰ		●					
半坂橋	2級市道　中津谷花原線	1967	28.7	4.8	RC橋	中津谷	2019	Ⅲ		●○				ひび割れ注入 断面修復等	
縦貫橋	2級市道　中津谷花原線	1982	52.6	4.9	PC橋	半坂	2020	Ⅱ			●				補修済(2011年度)
宇ノ子橋	2級市道　中津谷花原線	1973	30	4.6	鋼橋	半坂	2019	Ⅱ		●					
中央橋２	2級市道　市垣内細井原線	1965	40.9	6.7	PC橋	市垣内	2019	Ⅱ		●					
頓原線1号橋	その他市道　頓原線	1960	2.2	5.5	RC橋	頓原	2019	Ⅰ		●					
深山橋	その他市道　頓原線	1960	3.8	6	RC橋	頓原	2019	Ⅱ		●					
中頓原橋	その他市道　頓原線	1960	6.4	6	RC橋	頓原	2019	Ⅰ		●					
焼山橋	その他市道　頓原焼山線	1965	14.6	4	RC橋	汐原	2019	Ⅱ		●					補修済(2016年度)
頓原焼山線1号橋	その他市道　頓原焼山線	1960	4.5	4.1	RC橋	頓原	2019	Ⅰ		●					補修済(2016年度)
頓原焼山線2号橋	その他市道　頓原焼山線	1960	13.8	1.3	鋼橋	頓原	2017	Ⅲ				○	●	未定	
頓原焼山線3号橋	その他市道　頓原焼山線	1960	8	4	鋼橋	頓原	2019	Ⅱ		●					
大津橋	その他市道　中津谷大向線	1997	32.3	5.5	PC橋	中津谷	2019	Ⅰ		●					
箕腰橋	その他市道　半坂潮原線（支線）	1986	21.5	5	PC橋	半坂	2019	Ⅰ		●					
半坂焼山線2号橋	その他市道　半坂焼山線	2000	2	2	RC橋	半坂	2019	Ⅰ		●					
花原大向線1号橋	その他市道　花原大向線	1960	2.1	4.8	RC橋	花原	2019	Ⅱ		●					
花原2号線1号橋	その他市道　花原2号線	1985	2.4	4.4	RC橋	花原	2019	Ⅰ		●					
鍛冶屋橋	その他市道　田尻細井原線	1965	16	4.5	RC橋	細井原	2019	Ⅲ							撤去(2022年度)
田尻細井原線1号橋	その他市道　田尻細井原線	1965	2.1	4	RC橋	細井原	2019	Ⅰ		●					
細井原高橋線1号橋	その他市道　細井原高橋線	1960	2.7	3.9	RC橋	細井原	2019	Ⅱ		●					
田野原線1号橋	その他市道　田野原線	1970	5.4	4.4	鋼橋	細井原	2019	Ⅲ		●○				塗装塗替等	
石原福田線1号橋	その他市道　石原福田線	2000	5.5	12.4	BOX	石原	2019	Ⅰ		●					
市垣内田中原線2号橋	その他市道　市垣内田中原線	1990	3.3	1.8	RC橋	田中原	2019	Ⅰ		●					
栄橋	その他市道　田中原熊崎線	1980	10	5	PC橋	熊崎	2019	Ⅰ		●					
田中原熊崎線1号橋	その他市道　田中原熊崎線	1980	6.6	4.7	PC橋	田中原	2019	Ⅰ		●					
境谷橋	その他市道　下山立岩線	1990	19.3	1	鋼橋	下山	2019	Ⅰ		●					
下山立岩線1号橋	その他市道　下山立岩線	2000	9	0.8	鋼橋	下山	2019	Ⅰ		●					補修済(2015年度)
下山立岩線2号橋	その他市道　下山立岩線	2000	8	0.7	鋼橋	下山	2019	Ⅰ		●					
下山立岩線7号橋	その他市道　下山立岩線	1990	8	0.9	鋼橋	下山	2019	Ⅰ		●					

橋梁名	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	所在地	点検年度	診断区分	点検・補修等計画 ●定期点検 ○補修等工事 △調査設計					補修内容(主な措置内容)【予定】	備考欄
									R5	R6	R7	R8	R9		
潮原2号線1号橋	その他市道　潮原2号線	1990	8.2	4.8	PC橋	石原	2019	Ⅰ		●					
石原家見坂線1号橋	その他市道　石原家見坂線	1980	10.4	4.6	PC橋	石原	2019	Ⅰ		●					
石原家見坂線2号橋	その他市道　石原家見坂線	1970	2.8	4.8	RC橋	石原	2019	Ⅱ		●					
吉和伴蔵佐伯線1号橋	その他市道　吉和伴蔵佐伯線	1960	2.6	4.1	RC橋	伴蔵	2019	Ⅱ		●					
石原大津橋	その他市道　境線	1982	53.2	4.9	PC橋	石原	2020	Ⅱ			●				補修済(2016年度)
境線1号橋	その他市道　境線	1982	2	6	RC橋	石原	2019	Ⅰ		●					
境線2号橋	その他市道　境線	1982	2.5	6.5	RC橋	石原	2019	Ⅱ		●					
境線3号橋	その他市道　境線	1982	2	6.4	RC橋	石原	2019	Ⅱ		●					
妙音寺原橋	その他市道　八幡原線	1983	64	4	PC橋	0	2019	Ⅱ		●					補修済(2017年度)
八幡原線1号橋	その他市道　八幡原線	0	4.9	3.5	RC橋	下平良	2018	Ⅰ	●						
中山橋	1級市道　宮内更地線	1986	4.4	9.6	BOX	中山	2017	Ⅰ					●		
宮内更地1号橋	1級市道　宮内更地線	1986	4.5	10.2	BOX	下更地	2017	Ⅱ					●		
深江林ヶ原1号橋	1級市道　深江林ヶ原線	1980	5.3	16.1	BOX	下更地	2017	Ⅱ					●		
深江林ヶ原2号橋	1級市道　深江林ヶ原線	1980	8	16.2	BOX	別府	2017	Ⅱ					●		
深江林ヶ原3号橋	1級市道　深江林ヶ原線	1980	7.8	16.4	BOX	別府	2017	Ⅱ					●		
別府橋２	1級市道　深江林ヶ原線	1981	20.7	16.8	PC橋	別府	2018	Ⅰ	●						補修済(2017年度)
棚田橋（上り）	1級市道　深江林ヶ原線	1979	33	10	PC橋	知安	2021	Ⅱ				●			補修済(2013年度)
棚田橋（下り）	1級市道　深江林ヶ原線	1979	25.9	10	PC橋	知安	2021	Ⅱ				●			補修済(2013年度)
高畑橋（上り）	1級市道　深江林ヶ原線	1980	33	10	鋼橋	高畑・池田	2021	Ⅱ				●			
高畑橋（下り）	1級市道　深江林ヶ原線	1980	33	10	鋼橋	高畑・池田	2021	Ⅱ				●			
中津岡大橋（上り）	1級市道　深江林ヶ原線	1978	14.7	10.2	PC橋	小田ノ口	2021	Ⅱ				●			
中津岡大橋（下り）	1級市道　深江林ヶ原線	1978	14.7	10	PC橋	小田ノ口	2021	Ⅱ				●			
深江林ヶ原5号橋	その他市道　深江林ヶ原線	1995	3.4	10.2	BOX	林ヶ原二丁目	2017	Ⅰ					●		
池田橋	1級市道　物見山1号線	1981	25.5	12.6	PC橋	高畑・池田	2021	Ⅰ				●			
池田橋歩道橋	1級市道　物見山1号線	1987	25.5	2.5	鋼橋	高畑・池田	2021	Ⅰ				●			
毛保大橋	1級市道　三郎太田線	1974	30.5	10.3	PC橋	梅原一丁目・大国一丁目	2021	Ⅱ				●			
八坂1号橋	1級市道　林ヶ原鳴川線	1972	6.2	11.5	PC橋	宮浜温泉二丁目	2021	Ⅱ				●			補修済(2011年度)
林ヶ原鳴川2号橋	1級市道　林ヶ原鳴川線	1972	5.5	9.1	PC橋	四十八坂	2017	Ⅱ					●		
四十八坂橋	1級市道　林ヶ原鳴川線	1972	5	9	BOX	四十八坂	2017	Ⅱ					●		
八坂2号橋	1級市道　林ヶ原鳴川線	1972	3.1	9.1	RC橋	八坂	2017	Ⅱ					●		
戸石川橋	2級市道　中山鯛ノ原線	2005	11	11.2	PC橋	戸石川・中山	2018	Ⅰ	●						
丸子橋	2級市道　中山鯛ノ原線	1979	3.2	5.2	RC橋	十郎原	2017	Ⅱ					●		
十郎原橋	2級市道　中山鯛ノ原線	1979	13.5	7.7	PC橋	十郎原	2021	Ⅰ				●			
戸石川2号橋	2級市道　中山鯛ノ原線	1970	2.6	4.7	RC橋	戸石川	2017	Ⅰ					●		
別府2号橋	2級市道　早時鯛ノ原線	2000	6.2	31.5	BOX	別府	2017	Ⅱ					●		
中津岡懇ノ森1号橋	2級市道　中津岡懇ノ森線	1965	2	4.5	RC橋	滝山	2017	Ⅰ					●		
中空橋１	2級市道　中津岡懇ノ森線	1965	10.7	4.5	RC橋	中空・滝山	2021	Ⅱ				●			
中津岡懇ノ森2号橋	2級市道　中津岡懇ノ森線	2009	2.3	6.1	BOX	滝山	2017	Ⅰ					●		
港橋	2級市道　尾那岡丸石港線	1968	7.2	7.4	RC橋	丸石二丁目	2017	Ⅰ					●		
尾立跨線橋（側線部）	2級市道　尾立清水ヶ峯線	1981	53	9	PC橋	宮浜温泉一丁目	2018	Ⅰ	●						補修済(2016年度)
尾立跨線橋	2級市道　尾立清水ヶ峯線	1980	11.5	10	PC橋	宮浜温泉一丁目	2018	Ⅱ	●						補修済(2014年度)
逢瀬橋	2級市道　尾立清水ヶ峯線	1965	7.5	8.6	RC橋	宮浜温泉一丁目・尾立	2017	Ⅲ					●		補修済(2020年度)
縄田橋	2級市道　物見山縄田線	2010	41.6	12.8	PC橋	橋本・下ノ浜	2018	Ⅱ	●						
赤崎1号2号橋	その他市道　赤崎1号線	1970	3.6	5.4	RC橋	宮島口二丁目	2017	Ⅱ					●		
赤崎3号1号橋	その他市道　赤崎3号線	1975	2.4	13.6	RC橋	宮島口一丁目	2017	Ⅱ					●		
水口橋	その他市道　更地高畑線	1964	22.4	9	RC橋	水口・鯛ノ原	2021	Ⅲ				●			補修済(2022年度)
土井橋	その他市道　更地高畑線	1980	2.3	4.3	RC橋	土井	2017	Ⅰ					●		
更地高畑1号橋	その他市道　更地高畑線	1964	2	5.5	RC橋	高畑	2017	Ⅰ					●		
中津岡橋１	その他市道　郷原ノ前線	1965	13.7	4.8	RC橋	郷・小田ノ口	2018	Ⅱ	●						
妹背橋	その他市道　郷原ノ前線	1965	11	5.1	RC橋	原四丁目	2018	Ⅱ	●						
郷原ノ前1号橋	その他市道　郷原ノ前線	1965	2.9	5.4	BOX	原四丁目	2017	Ⅰ					●		
棚田橋	その他市道　屋田越棚田線	1964	19.8	3	鋼橋	棚田	2021	Ⅱ				●			
筏津橋	その他市道　棚田郷線	1995	28.2	9.9	PC橋	池田・沖筏津	2021	Ⅰ				●			補修済(2014年度)
出合橋	その他市道　棚田郷線	1967	19	5.2	PC橋	郷	2021	Ⅱ				●			
塩屋大橋	その他市道　小田島片浜線	1975	17.8	8.8	PC橋	沖塩屋三丁目	2021	Ⅱ				●			補修済(2016年度)

橋梁名	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	所在地	点検年度	診断区分	点検・補修等計画 ●定期点検 ○補修等工事 △調査設計					補修内容(主な措置内容)【予定】	備考欄
									R5	R6	R7	R8	R9		
片浜橋	その他市道　小田島片浜線	1977	26.1	8.8	ＰＣ橋	林ヶ原一丁目	2021	Ⅱ				●			
上桐林ヶ原1号橋	その他市道　上桐林ヶ原線	1970	3.1	3	ＲＣ橋	上桐	2017	Ⅱ					●		
深江1号橋	その他市道　深江2号線	1972	3.4	6.4	ＲＣ橋	深江三丁目	2017	Ⅱ					●		
深江4号1号橋	その他市道　深江4号線	1980	3.4	5	BOX	深江一丁目	2017	Ⅰ					●		
深江橋	その他市道　深江10号線	1969	4.9	9.4	ＲＣ橋	深江一丁目	2017	Ⅰ					●		
防府橋	その他市道　深江11号線	1969	3.2	6	ＲＣ橋	深江一丁目・二丁目	2017	Ⅱ					●		
防府2号橋	その他市道　深江11号線	1969	2.8	6	ＲＣ橋	深江二丁目	2017	Ⅰ					●		
防府3号橋	その他市道　深江11号線	1969	3.7	4	ＲＣ橋	深江二丁目	2017	Ⅱ					●		
深江11号1号橋	その他市道　深江11号線	1969	2.8	4	ＲＣ橋	深江二丁目	2017	Ⅱ					●		
深江11号2号橋	その他市道　深江11号線	1969	2.1	4.7	ＲＣ橋	深江二丁目	2017	Ⅰ					●		
鯛ノ原1号1号橋	その他市道　下更地3号線	1969	5.5	23.1	BOX	下更地	2017	Ⅱ					●		
上更地1号1号橋	その他市道　上更地1号線	1979	3	5.5	BOX	上更地	2017	Ⅱ					●		
上更地2号1号橋	その他市道　上更地2号線	1973	6	4.5	BOX	上更地	2018	Ⅱ	●						
更地2号橋	その他市道　上更地2号線	1973	5	6	ＲＣ橋	上更地	2018	Ⅲ	●						補修済(2021年度)
下更地1号1号橋	その他市道　下更地1号線	1984	6.8	7.2	BOX	下更地	2017	Ⅱ					●		
高見橋	その他市道　高見1号線	1965	11.7	4.5	ＲＣ橋	高見	2018	Ⅱ	●						補修済(2009年度)
水ノ越橋	その他市道　水ノ越1号線	1964	16.9	4.3	鋼橋	水ノ越	2017	Ⅲ			△	○	●	未定	
永慶寺橋	その他市道　下ノ浜1号線	2007	44.5	7.2	ＰＣ橋	橋本・下の浜	2021	Ⅰ				●			
妹背第2歩道橋	その他市道　西村1号線	1996	22.8	2.8	ＰＣ橋	梅原一丁目・大国一丁目	2021	Ⅰ				●			
丸石橋	その他市道　丸石6号線	1974	10.3	5.2	ＰＣ橋	丸石二丁目	2018	Ⅱ	●						
尾立川橋	その他市道　尾立1号線	1970	3.6	2.8	ＲＣ橋	丸石三丁目・宮浜温泉一丁目	2017	Ⅱ					●		
宝橋	その他市道　宮浜2号線	1975	3.9	4	ＲＣ橋	清水ケ峯	2018	Ⅰ	●						
倉の谷橋	その他市道　倉ノ谷線	2006	44	6.2	ＰＣ橋	橋本新開・下ノ浜	2018	Ⅰ	●						
高畑1号1号橋	その他市道　高畑1号線	1988	2.7	4.7	ＲＣ橋	高畑	2018	Ⅰ	●						
高畑2号1号橋	その他市道　高畑2号線	1988	2.5	6.5	ＲＣ橋	高畑	2018	Ⅰ	●						
塩屋川橋	その他市道　塩屋2号線	1984	8	7	ＲＣ橋	塩屋一丁目・二丁目	2018	Ⅱ	●						
鯛ノ原橋	その他市道　鯛ノ原1号線	1992	17.4	6.2	ＰＣ橋	水口・鯛ノ原	2021	Ⅱ				●			
早時7号1号橋	その他市道　早時7号線	1980	2.3	7.3	BOX	深江一丁目	2018	Ⅰ	●						
丸子山橋	その他市道　四郎峠観音線	1986	2	9	ＲＣ橋	中山	2018	Ⅱ	●						
中山2号線橋	その他市道　中山2号線	1980	6.6	5	ＲＣ橋	平岩	2018	Ⅱ	●						
中山戸石川1号橋	その他市道　中山戸石川線	1980	6	5	ＲＣ橋	中山	2018	Ⅱ	●						
中山戸石川2号橋	その他市道　中山戸石川線	1980	9	5	ＰＣ橋	中山	2018	Ⅲ	●						補修済(2020年度)
中山高見1号橋	その他市道　中山高見線	1985	2.4	13.8	ＲＣ橋	中山・高見	2018	Ⅰ	●						
中山高見線橋	その他市道　中山高見線	1985	13	5	ＲＣ橋	高見	2021	Ⅱ				●			
三鍋谷中津岡線橋	その他市道　三鍋谷中津岡線	1985	3.5	5	ＲＣ橋	中空	2018	Ⅱ	●						
中津岡橋２	その他市道　中津岡滝ノ下線	1984	16.9	5	ＲＣ橋	中津岡	2021	Ⅱ				●			
小山橋	その他市道　滝ノ下清水ヶ峯線	1975	15.8	4.8	ＲＣ橋	原四丁目・譲安	2021	Ⅱ				●			補修済(2021年度)
清水ヶ峯橋	その他市道　滝ノ下清水ヶ峯線	1985	5	5	ＲＣ橋	塩屋一丁目・上桐	2018	Ⅰ	●						
青海苔川1号橋	その他市道　滝ノ下清水ヶ峯線	1990	7	7.5	ＲＣ橋	林ヶ原二丁目	2018	Ⅰ	●						
宮浜橋	その他市道　清水ヶ峯1号線	1985	4.8	4.6	ＲＣ橋	清水ヶ峯	2018	Ⅰ	●						
鳴川橋	その他市道　鳴川3号線	1985	10.4	7	ＲＣ橋	鳴川	2018	Ⅰ	●						
鳴川3号1号橋	その他市道　鳴川3号線	1985	3.3	3.3	ＲＣ橋	鳴川	2018	Ⅰ	●						
下灘西川橋	その他市道　下灘2号線	1965	5.8	5.4	ＲＣ橋	下灘	2018	Ⅰ	●						
下灘2号1号橋	その他市道　下灘2号線	1965	3.6	5.8	ＲＣ橋	下灘	2018	Ⅰ	●						
塩屋3号1号橋	その他市道　塩屋3号線	1991	3.7	9.4	ＰＣ橋	塩屋二丁目	2018	Ⅰ	●						
前空橋	その他市道　物見山前空線	2004	21.4	13.3	ＰＣ橋	物見東二丁目・前空三丁目	2018	Ⅱ	●						
新妹背橋	その他市道　中央11号線	2007	12.5	10.5	ＰＣ橋	原四丁目・中央四丁目	2018	Ⅰ	●						
中央1号側道橋	その他市道　中央21号線	2007	24.3	7	ＰＣ橋	大野中央二丁目・三丁目	2021	Ⅰ				●			
中央2号側道橋	その他市道　中央17号線	2007	24.2	7	ＰＣ橋	大野中央一丁目	2021	Ⅰ				●			
毛保橋	その他市道　原ノ前林ヶ原線	1965	10	6.1	ＲＣ橋	大新開・原二丁目	2018	Ⅰ	●						補修済(2011年度)
前ノ原林ヶ原1号橋	その他市道　原ノ前林ヶ原線	1990	2.5	5.6	BOX	塩屋一丁目・二丁目	2018	Ⅰ	●						
土石川橋	その他市道　中山５号線	1970	7.5	3.6	ＲＣ橋	中山	2018	Ⅰ	●						
戸石川２号線１号橋	その他市道　戸石川２号線	1965	2.3	9.1	ＲＣ橋	戸石川	2018	Ⅰ	●						
棚田歩道橋	その他市道　土井５号線	1964	17.5	2.3	鋼橋	棚田	2021	Ⅱ				●			
小田ノ口３号線１号橋	その他市道　小田ノ口３号線	1970	3	4.1	ＲＣ橋	筏津	2018	Ⅰ	●						

橋梁名	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	所在地	点検年度	診断区分	点検・補修等計画 ●定期点検 ○補修等工事 △調査設計					補修内容(主な措置内容)【予定】	備考欄
									R5	R6	R7	R8	R9		
青海苔橋	その他市道　林ヶ原４号線	1965	6.3	5.8	ＲＣ橋	林ヶ原	2018	Ⅰ	●						補修済(2011年度)
林ヶ原９号線１号橋	その他市道　林ヶ原９号線	1985	6	5	ＰＣ橋	林ヶ原	2018	Ⅰ	●						
ざんねんさん橋	その他市道　八坂１７号線	1985	40	3.8	ＰＣ橋	八坂	2020	Ⅱ			●				
馬ノ口線１号橋	その他市道　馬ノ口線	1970	2.5	3.6	ＲＣ橋	大野	2018	Ⅰ	●						
中空橋２	その他市道　中空1号線	1987	42.3	3	ＰＣ橋	大野	2020	Ⅱ			●				
早時4号線1号橋	その他市道　早時4号線	0	4	6.2	ＲＣ橋	大野	2018	Ⅰ	●						
土井3号線1号橋	その他市道　土井3号線	2013	2.3	6.7	ＲＣ橋	大野	2018	Ⅱ			●				
新小山橋	その他市道 深江林ヶ原線	2017	23	10	ＰＣ橋	大野	2025	Ⅰ	●						
御綾橋	1級市道　中江大町線	1966	9.3	4.3	ＲＣ橋	宮島町南町	2018	Ⅱ	●						
筋違橋	1級市道　中江滝線	1961	10.8	4.8	ＲＣ橋	宮島町久保	2018	Ⅱ	●						
久保橋	その他市道　中江中西線	1963	7.4	4.9	ＰＣ橋	宮島町久保	2018	Ⅰ	●						
白糸川下橋	その他市道　久保１号線	1964	3	4.5	ＲＣ橋	宮島町久保	み	Ⅱ					●		
白糸川中橋	その他市道　久保２号線	1964	3	4	鋼橋	宮島町久保	2017	Ⅱ					●		
白糸川上橋	その他市道　滝中西線	1965	4.1	3.3	鋼橋	宮島町久保	2017	Ⅱ					●		
滝橋	1級市道　中西線	1965	10.9	6.4	ＲＣ橋	宮島町滝町	2017	Ⅰ					●		
大西橋	1級市道　大西１号線	1986	6.8	4.6	ＲＣ橋	宮島町大西	2018	Ⅰ	●						
西松原橋	その他市道　大西２号線	1975	7	4.5	ＲＣ橋	宮島町大西	2018	Ⅱ	●						
杉の浦２号線１号橋	2級市道　杉の浦２号線	1970	7.1	3.3	鋼橋	宮島町杉の浦	2018	Ⅲ	●○					塗装塗替等	
杉の浦２号線２号橋	2級市道　杉の浦２号線	1970	5.1	4	鋼橋	宮島町杉の浦	2018	Ⅲ	●	○				塗装塗替等	
上橋	2級市道　杉の浦３号線	1970	2.9	3.9	ＲＣ橋	宮島町杉の浦	2017	Ⅰ					●		
ツツミ橋	2級市道　包ヶ浦大砂利線	1974	8.5	4.6	ＲＣ橋	宮島町包ヶ浦	2017	Ⅱ					●		
包ヶ浦大砂利線１号橋	2級市道　包ヶ浦大砂利線	1970	2.3	3.2	BOX	宮島町入浜	2017	Ⅱ					●		
包ヶ浦大砂利線２号橋	2級市道　包ヶ浦大砂利線	1955	2	3	ＲＣ橋	宮島町入浜	2017	Ⅰ					●		
包ヶ浦大砂利線３号橋	2級市道　包ヶ浦大砂利線	1955	4.4	3.3	ＲＣ橋	宮島町大砂利	2017	Ⅱ					●		
大元橋	2級市道　大元多々良線	1976	12	5.8	ＰＣ橋	宮島町網之浦	2017	Ⅱ					●		
江之浦橋	2級市道　大元多々良線	1981	7.3	4.6	ＰＣ橋	宮島町江之浦	2018	Ⅱ	●						
１号橋	その他市道　多々良奥の院線	1981	8.4	4.6	ＰＣ橋	宮島町多々良～奥の院	2018	Ⅲ	●		○			ひび割れ注入 断面修復等	
２号橋	その他市道　多々良奥の院線	1981	7.7	4	ＰＣ橋	宮島町多々良～奥の院	2018	Ⅰ	●						
６号橋	その他市道　多々良奥の院線	1981	5.9	4	ＰＣ橋	宮島町多々良～奥の院	2018	Ⅰ	●						
７号橋	その他市道　多々良奥の院線	1981	4.3	4.7	ＲＣ橋	宮島町多々良～奥の院	2018	Ⅰ	●						
１０号橋	その他市道　多々良奥の院線	1981	4.3	4.5	ＲＣ橋	宮島町多々良～奥の院	2018	Ⅱ	●						
１１号橋	その他市道　多々良奥の院線	1981	8	4.6	ＰＣ橋	宮島町多々良～奥の院	2018	Ⅱ	●						
１２号橋	その他市道　多々良奥の院線	1981	7	4.6	ＰＣ橋	宮島町多々良～奥の院	2018	Ⅰ	●						
１３号橋	その他市道　多々良奥の院線	1981	4.3	4.7	ＲＣ橋	宮島町多々良～奥の院	2018	Ⅰ	●						
杉の浦６号線１号橋	その他市道　杉の浦６号線	1954	3.1	12.2	ＲＣ橋	宮島町杉之浦	2017	Ⅱ					●		
新佐方大橋	その他市道　平良佐方線	2021	68	14.5	鋼橋	廿日市市	2021	Ⅰ				●			

※補修等工事の予定箇所については，今後の定期点検や補修の実施状況，補修技術の進展，財政事情及や社会情勢の変化等を反映し，適宜見直します。
